www.fronik.nl
FRONIK
grond-, water en wegenbouw

Werknummer :	21380
Besteknummer :	K-25
Datum :	17-11-2021
Wijziging :	10-12-2021
Wijziging :	
Opgesteld door :	F. van der Zon

Omschrijving :	Vervangen vacuüriolering door drukriolering
Straatnaam :	Weipoortseweg / Ommedijkseweg
Plaats werk :	Zoeterwoude
Opdrachtgever :	Gemeente Zoeterwoude
Directie :	Gemeente Zoeterwoude

Post	Omschrijving:	hoe-veel-heid:	een-heid:
	Voorbereiden werkzaamheden		
1	Inrichten werkterrein	1,0	st
2	Aanbrengen vooraankondiging	2,0	st
3	Graven proefsleuven	10,0	st
	Gestuurde boringen tot Weddepad		
4	Aanbrengen/omzetten verkeersmaatregelen	1,0	st
5	Graven in- en uittredeput	6,0	st
6	Aanbrengen gestuurde boring	3,0	st
7	Aanvullen in- en uittredeput	6,0	st
8	Verwijderen verkeersmaatregelen	1,0	st
	Boogboringen tot Weddepad		
9	Aanbrengen/omzetten verkeersmaatregelen	1,0	st
10	Graven in- en uittredeput	38,0	st
11	Aanbrengen boogboring	19,0	st
12	Aanvullen in- en uittredeput	38,0	st
13	Verwijderen verkeersmaatregelen	1,0	st
	Hoofdleiding tot Weddepad		
14	Aanbrengen/omzetten verkeersmaatregelen	1,0	st
15	Graven sleuf	1.350,0	m1
16	Aanbrengen persleiding	1.350,0	m1
17	Aanvullen sleuf	1.350,0	m1
18	Verwijderen verkeersmaatregelen	1,0	st
	Aansluiting particulier terrein tot Weddepad		
19	Graven sleuf	280,0	m1
20	Aanbrengen persleiding	280,0	m1
21	Aanvullen sleuf	280,0	m1
	Gestuurde boringen Weddepad-Nieuweweg		
22	Aanbrengen verkeersomleiding en bouwhekken	1,0	st
23	Graven in- en uittredeput	2,0	st
24	Aanbrengen gestuurde boring	1,0	st
25	Aanvullen in- en uittredeput	2,0	st
26	Verwijderen verkeersomleiding en bouwhekken	1,0	st
	Boogboringen Weddepad-Nieuweweg		
27	Aanbrengen verkeersomleiding en bouwhekken	1,0	st
28	Graven in- en uittredeput	6,0	st
29	Aanbrengen boogboring	3,0	st
30	Aanvullen in- en uittredeput	6,0	st
31	Verwijderen verkeersomleiding en bouwhekken	1,0	st
	Hoofdleiding Weddepad-Nieuweweg		
32	Aanbrengen verkeersomleiding en bouwhekken	1,0	st
33	Graven sleuf	140,0	m1
34	Aanbrengen persleiding	140,0	m1
35	Aanvullen sleuf	140,0	m1
36	Verwijderen verkeersomleiding en bouwhekken	1,0	st
	Aansluiting particulier terrein Weddepad-Nieuweweg		
37	Graven sleuf	30,0	m1
38	Aanbrengen persleiding	30,0	m1
39	Aanvullen sleuf	30,0	m1
	Ombouwen pompputten		
40	Verwijderen vacuüminstallatie	33,0	st
41	Aanbrengen drukinstallatie	31,0	st
	Opruimwerkzaamheden		
42	Opruimen werk- en keetterrein	1,0	st

Maand: 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Weeknr.: m d w d v per week

Datum / Dag

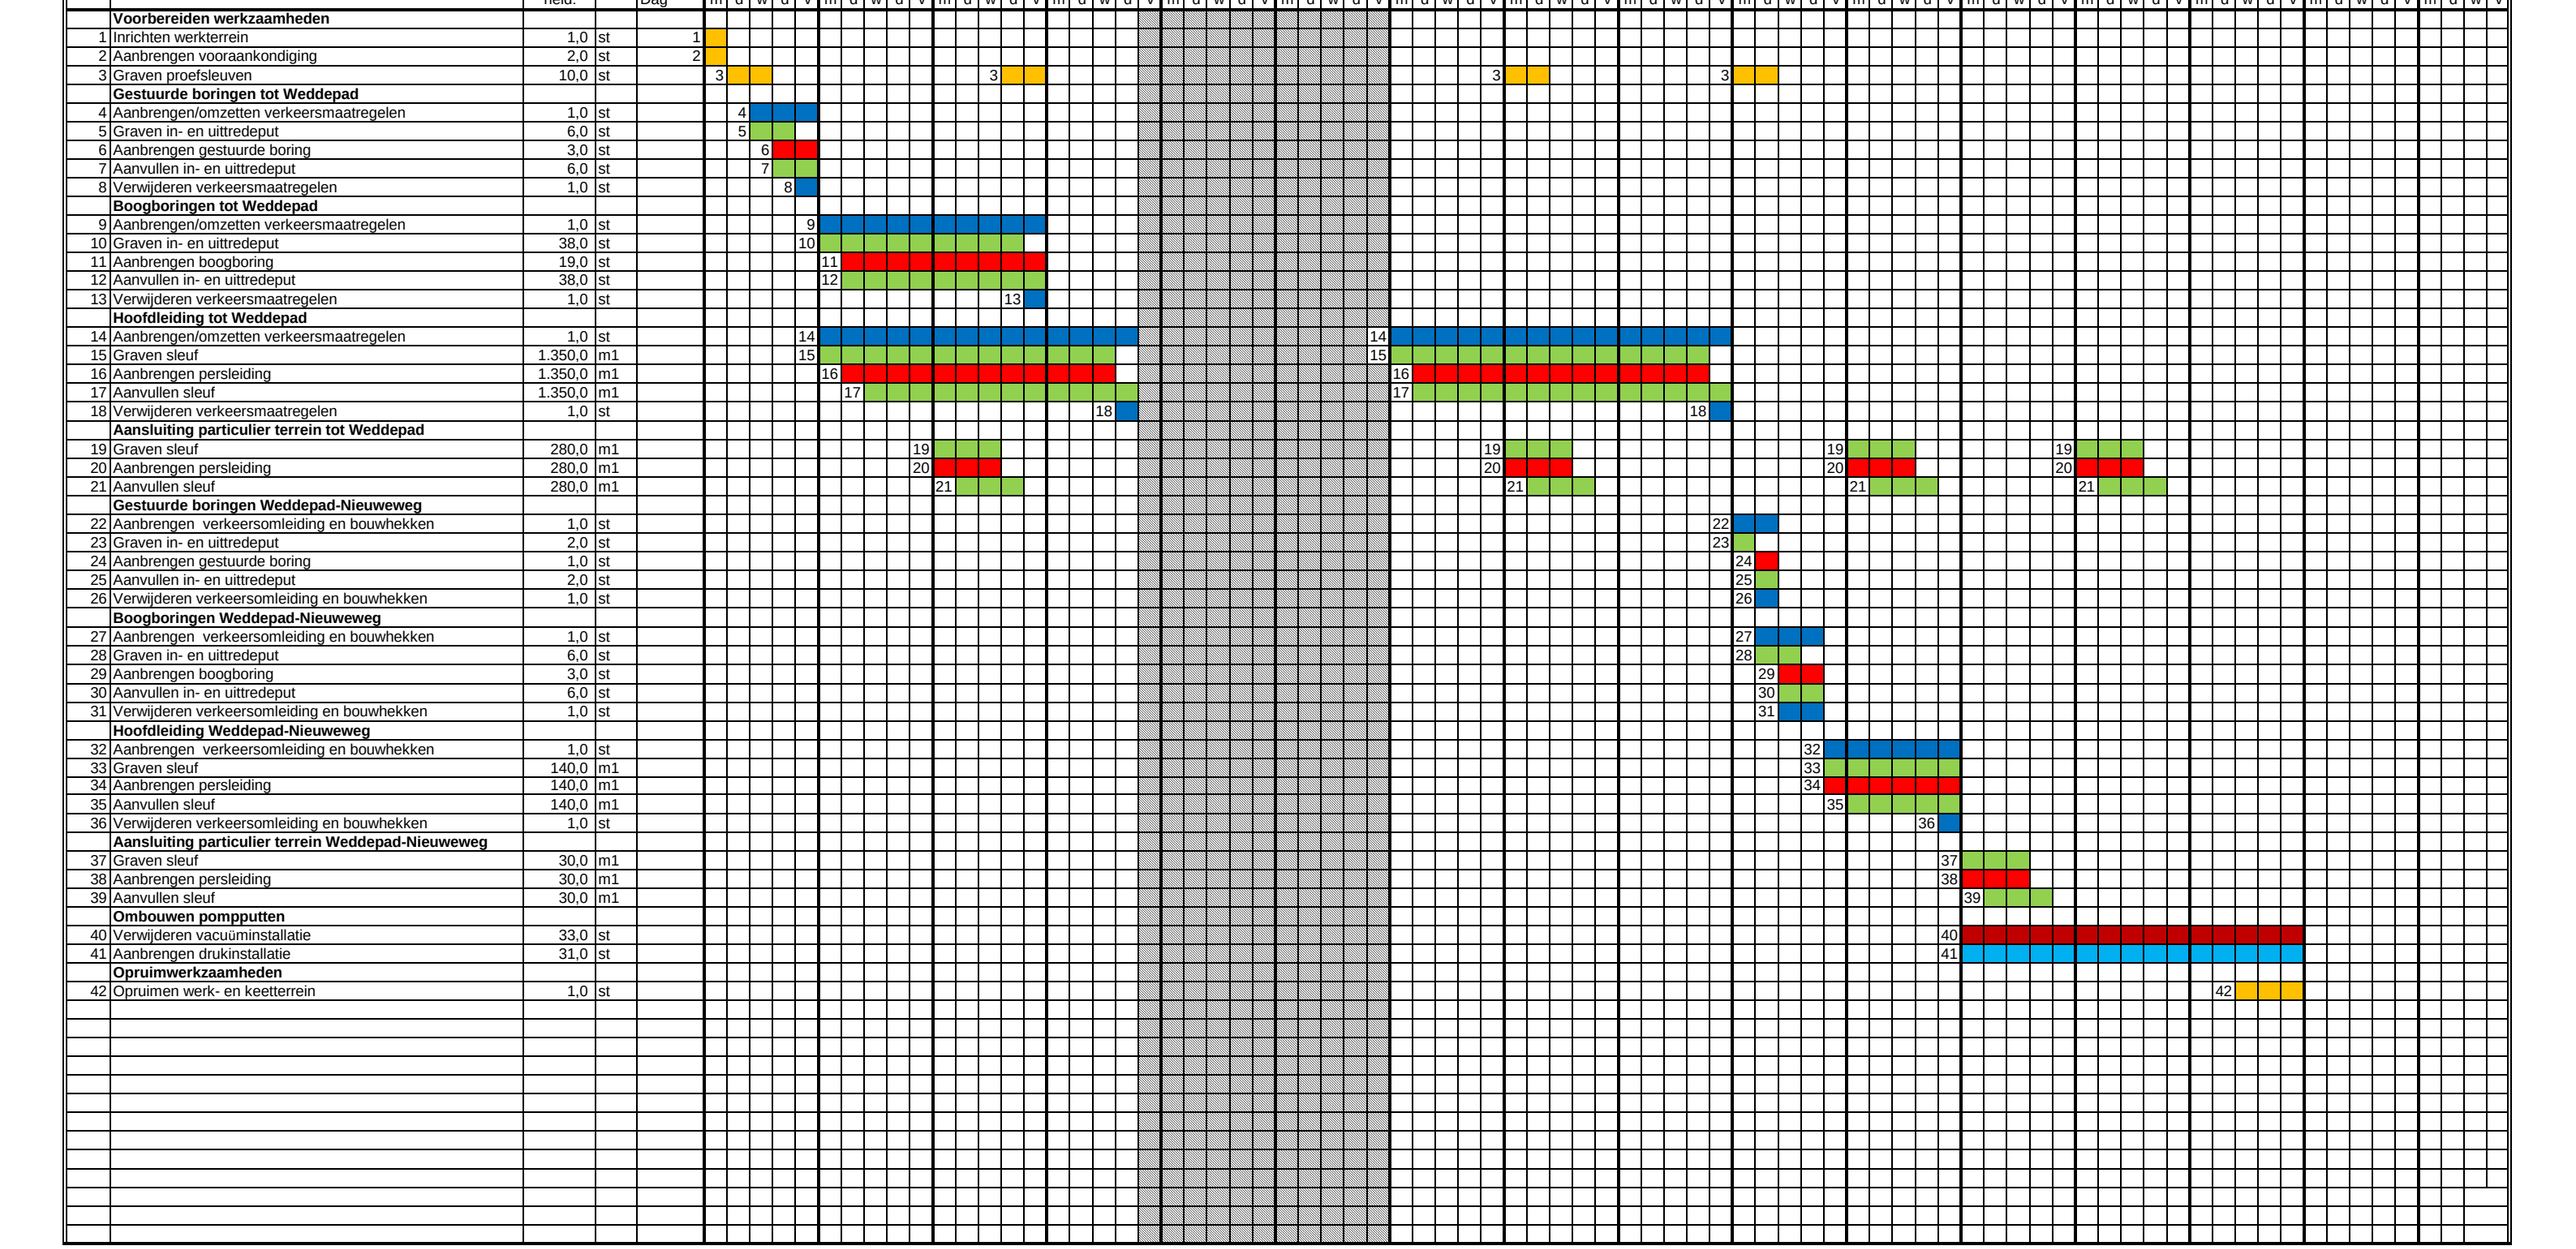

Filename: E:\Calculatie_werkvoorbereiding\Werkvoorbereiding\2021\21380 - Vervangen vacuumriool Weipoortseweg - Zoeterwoude\K Planning\Werkplanning aangepast Weipoortseweg.xlsx
